


作業報告書

案件名：AAP周南原発電所

報告日：2019/9/13

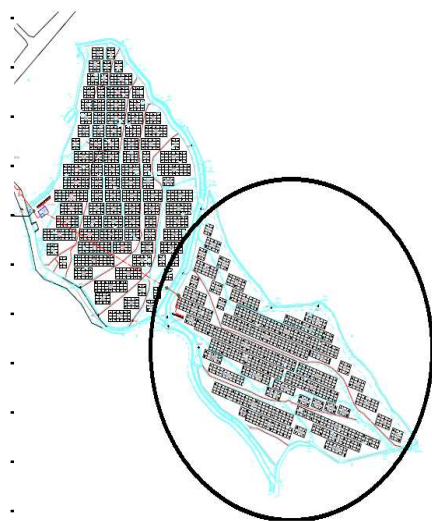

内 容

南側エリア墨出し

順次杭打ち

進捗写真は後日添付

内 容

モジュール納品予定日

10月17日、1440枚

10月24日、1500枚

内 容
